


# TRIP AVICCA 2016

## Point d'étape PACA THD



## GÉNÈSE DE L'ACTION ANT DE PACA THD

- **2004 - 2012** : différents programmes d'aide à la résorption de zones blanches puis de montée en débit et maîtrise d'ouvrage des réseaux de collecte à RENATER
- **Stratégie de Cohérence Régionale ANT en décembre 2011 et SDTAN 04 et 05 (début 2012)**
- Décision de création d'un syndicat mixte ouvert en juin 2012
- **Arrêté préfectoral de création - octobre 2012**
- 3 membres : région Paca et départements des Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes
- 1 projet à 5 ans bâti sur les bases des 2 SDTAN présentés au FSN
- **Accord préalable FSN obtenu en janvier 2014**
- **Programmation de crédits FEDER**
- **Première phase de chantiers MED 2014-2015**
- **Accord FSN phase II obtenu en début 2016 pour la MED phase I**

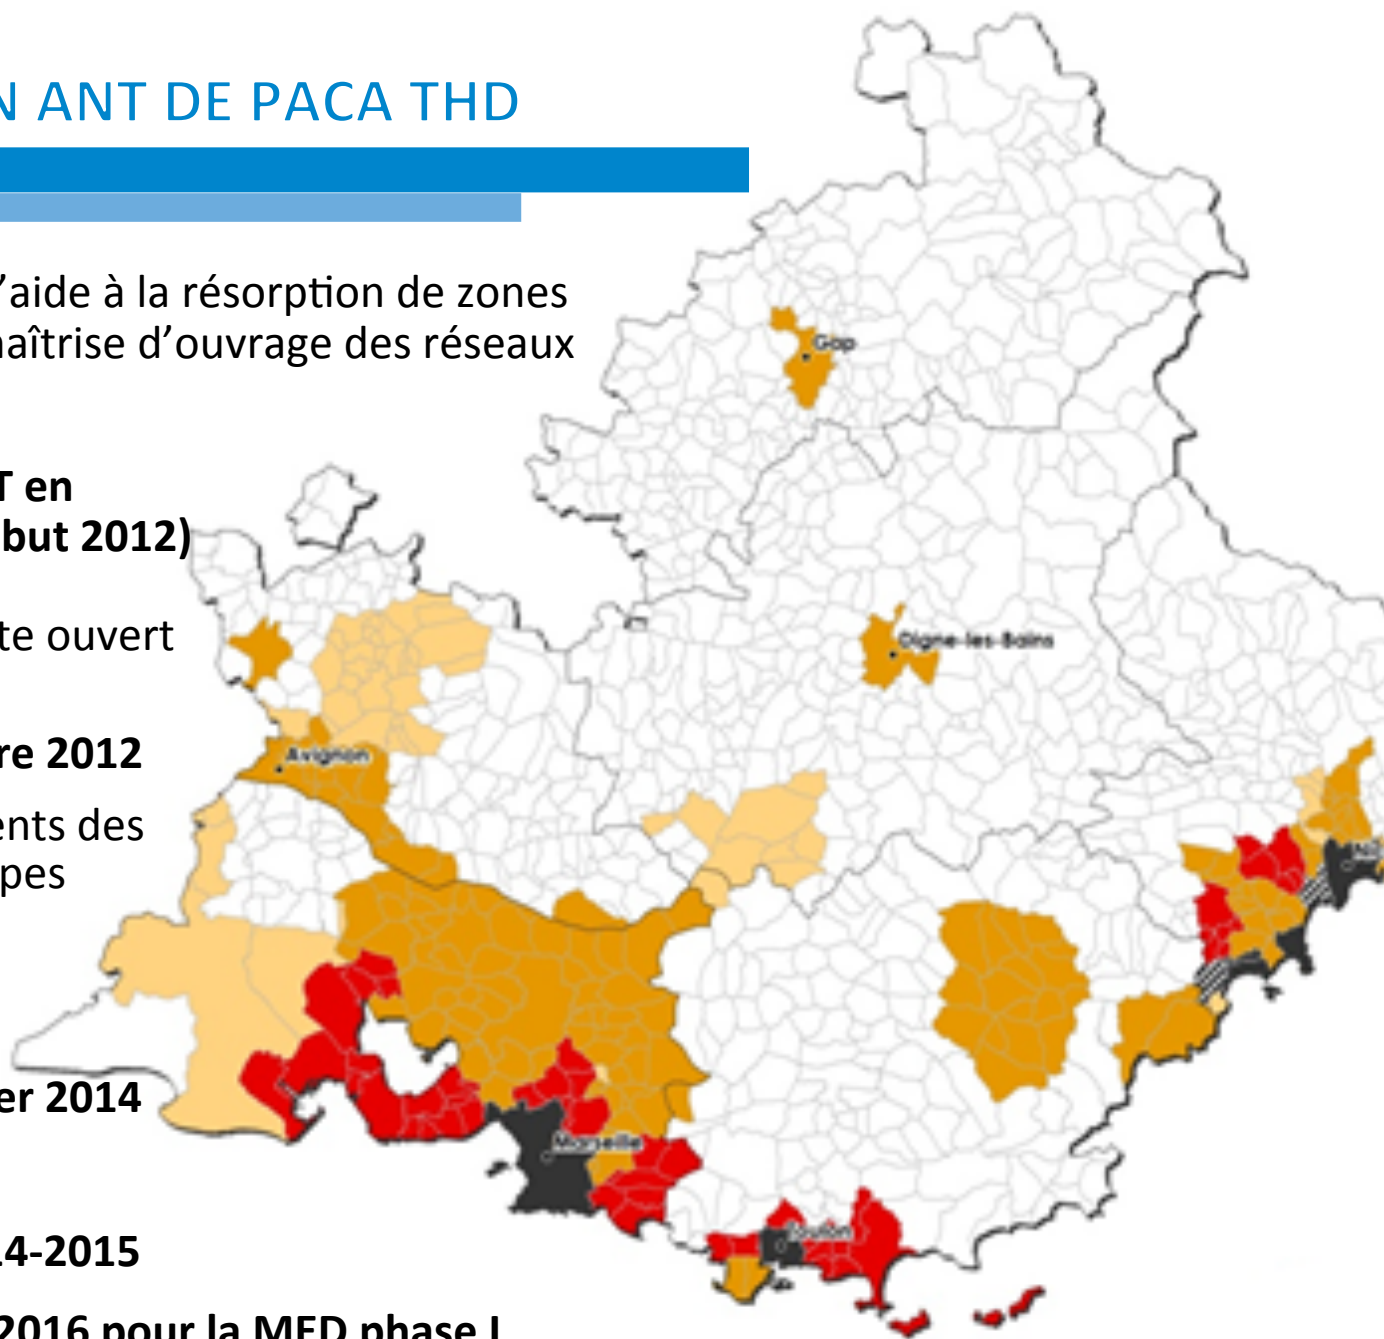

# MODÈLE JURIDIQUE RETENU POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ANT

## Choix du modèle juridique :

Modèle concessif non compatible avec l'économie du projet

## Choix de l'affermage

Conception et construction du réseau (Mix technologique) par le biais de marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux

## Objet de la DSP en affermage :

- Accompagnement de PACA THD dans les processus d'études (MOE) et de réception des infrastructures
- Exploitation des infrastructures THD de PACA THD
- Réalisation des raccordements FttH et FttE
- Développement d'offres FttH et FttE activées pour renforcer la concurrence
- Dispositif satellitaire

**Durée de la DSP : 15 ans**

**Périmètre initial** : départements des Alpes-de-Haute Provence et des Hautes-Alpes,

**Extensible en fonction d'éventuelles adhésions complémentaires de nouveaux départements**

➔ Transposition récente de la Directive européenne sur les concessions

## CARACTÉRISTIQUES DE LA DSP EN AFFERMAGE

**Planning de la procédure : 1 an et ½ de procédure**

août 2014 à décembre 2015

2 mois d'attente - Adhésion du Sictiam à Paca THD avortée

Concurrence : 4 offres, 1 retrait en cours de négociation

**Attributaire :** 

**Société ad-hoc créée :** Provence-Alpes Connect - P

**Nom du réseau :** 

**économie du projet :**

216 M€ de chiffre d'affaires prévisionnel

60 M€ de redevances versées à la collectivité  
(en moyenne 34 € par prise exploitée par an)

iBLO : supporté par le délégataire, mais partage  
du risque (50/50) sur les évolutions des coûts  
iBLO par rapport aux prévisions ARCEP

Subventionnement de raccordement FttH forfaitaire (100 €), sans aléa pour PACA THD

Mécanismes contractuels souples et prévisibles en cas de variation à la hausse ou à la baisse  
du rythme de livraison FttH afin d'éviter les situations de blocage

Absence de flux de fin de contrat : pas de VNC non amortie sur les investissements portés  
par le délégataire et reversement de la part publique sur les IRU au moment de leur  
encaissement

| Année | Nombre de prises livrées | Nombre cumulé de prises |
|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1     | 7 000                    | 7 000                   |
| 2     | 15 000                   | 22 000                  |
| 3     | 20 000                   | 42 000                  |
| 4     | 20 000                   | 62 000                  |
| 5     | 14 620                   | 76 620                  |
| 6     | 14 620                   | 91 239                  |
| 7     | 14 620                   | 105 859                 |
| 8     | 14 620                   | 120 478                 |

| Année | Nombre de prises livrées | Nombre cumulé de prises |
|-------|--------------------------|-------------------------|
| 9     | 14 620                   | 135 098                 |
| 10    | 14 620                   | 149 717                 |
| 11    | 14 620                   | 164 337                 |
| 12    | 14 620                   | 178 956                 |
| 13    | 14 620                   | 193 576                 |
| 14    | 14 620                   | 208 195                 |
| 15    | 7 310                    | 215 505                 |

## PACA THD EN QUELQUES CHIFFRES

- **1<sup>er</sup> plan quinquennal : 105 M€ (30 M€ FSN, 15 M€ de Feder, 15 M€ région, 15 M€ 2 départements, 25 M€ d'emprunt)**
- **2013** : passation des **3** premiers marchés de MED (Orange, Circet sous-traitant)
- **2014 - 2015** : **90** chantiers de montée en débit / opticalisation NRA, NRA-ZO (18 M€ et 17 000 lignes)
- **2015** : passation de procédures
  - **2** marchés de MOE (Lmi/Suez et Egis/Parera) en **gpt de commandes avec le Sictiam**
  - **2** accords-cadres de travaux (MED et FTTH) également en gpt de commandes et **8** sociétés retenues sur les 2 accords-cadres : Axione, Circet, Sogetrel, Imoptel, Inéo, Sobeca, Mancipoz, Etec
  - **1** DSP en affermage à Altitude Infrastructure
- En **2016** : budget total de plus de **30 M€**
  - Passation des marchés subséquents - **2** attribués à ce jour et **2** à venir très rapidement
  - **6** premiers NRO pour **13 000** prises FTTH à remettre en affermage - **10 M€**
  - Plus **50** opticalisations de NRA et de création de NRA-MED - **10 M€**
  - Sites FTTE par anticipation (ZAE, sites stratégiques, santé, éducation, etc...) - **1,2 M€**
  - **1** réseau de collecte (axe de la Durance) - **5,4 M€**
  - **140** km de fourreaux le long de la ligne de chemin de fer Nice-Digne équipés en FO

## LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES

Le SMO = une structure autonome de projet

Un renforcement nécessaire des effectifs du syndicat - recrutements en cours  
(ing. études, SIG, logistique, chargé de communication, RH)

Bonus tridépartemental :

- Synergie du projet Paca THD avec celui du Sictiam
- Adhésion potentielle des Bouches-du-Rhône

Une vocation régionale en devenir

Aspect technique

- L'hébergement des NRO dans les NRA - vérification de l'adéquation avec le planning du projet
- Faire adopter le format GraceTHD aux différents acteurs (MOE, entreprises de travaux, délégataire) et respect de la prise en affermage

Une nécessaire coordination aux frontières du territoire

- Possibilité de traitement de projets en co-maîtrise d'ouvrage (ligne Nice-Digne, projets à cheval sur 2 territoires, cas du Dévoluy avec la région ARA et le département de l'Isère)
- Des projets conjoints avec les départements limitrophes
- Nécessité de rationalisation sur certains territoires AMII

Équilibrage des charges d'amortissement liées aux constructions de réseaux avec les redevances d'affermage - nécessité d'optimiser la production des prises par le SMO

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**

